



1

Hvordan forbereder og organiserer
Sygehus Lillebælt sig ved indflytning?



Netværksdage 31. august og 1. september 2016

Erfaringsudveksling

Punkter:

1. Sygehus Lillebælt, fakta. Nu 5, fokus 3-1
2. Strategi/plan
3. Overblik og antal rokader
4. Styregruppe Rokadekuffert
5. Ansvar, milepæle
6. FOKUS
7. Hvad nu? Godt/skidt
8. Spørgsmål efter begge oplæg



Fakta:

Sygehus Lillebælt består af 5 matrikler

Ambulante besøg 2015: **634.682**

Sengedage 2015: **185.348**

Udskrevne patienter 2015: **53.164**


Ca. 600 senge

3.1 mia kr

4.300 fuldtidsstillinger

Akutsygehuset i Kolding


940 mio. kr. 314 senge



Situationsplan – Fuld udbygget

Signaturforklaring

- Fase 2 + 3
- Sundhedshus
- Fremtidig udvidelse
- Byggefelter

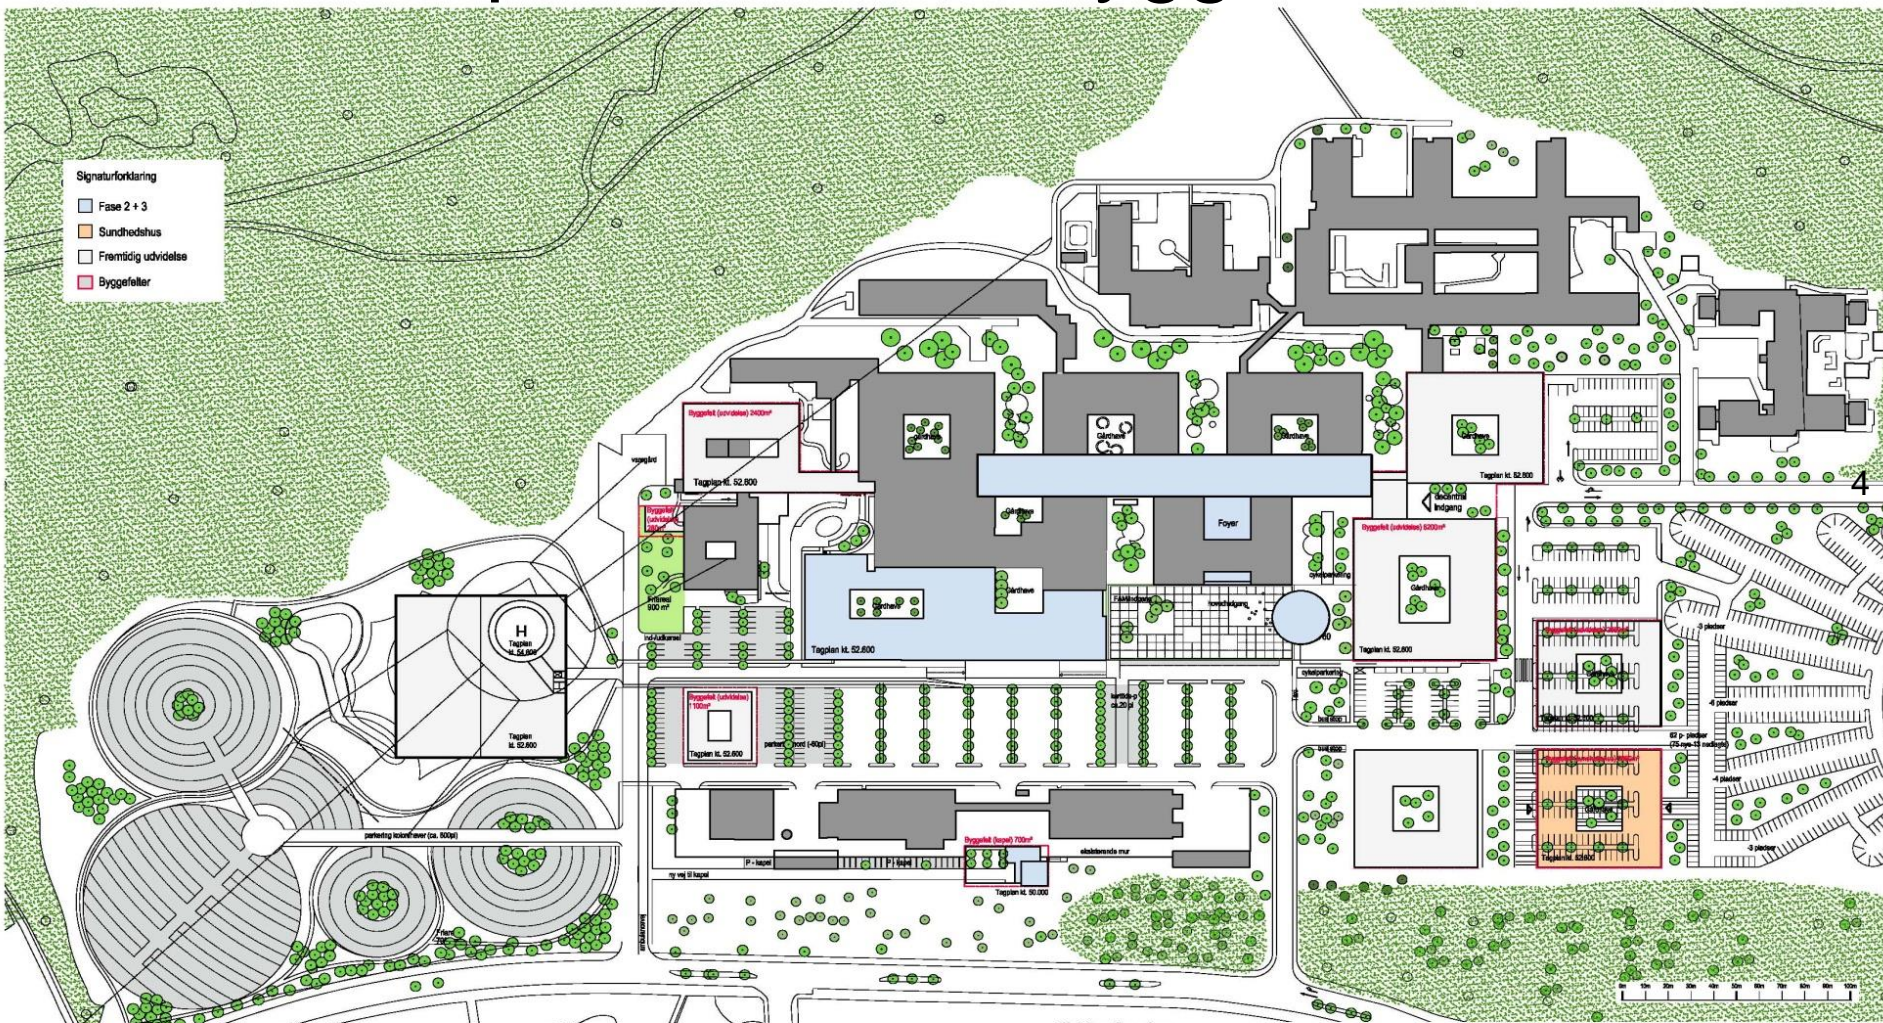

Kolding Sygehus

Titel: VVM illustration - Alternativt plus

Saga nr.: 2010-012

Rådgiver:

- NIRAS
- CRED
- SHL
- BALSLEV
- GBL

Skitse nr.: VVM 04


Dato: 2011.10.27

Skala: Ikke målfæst

Udført: MEB

**Udbygning
Kolding sygehus**

Velkommen til rokadens år

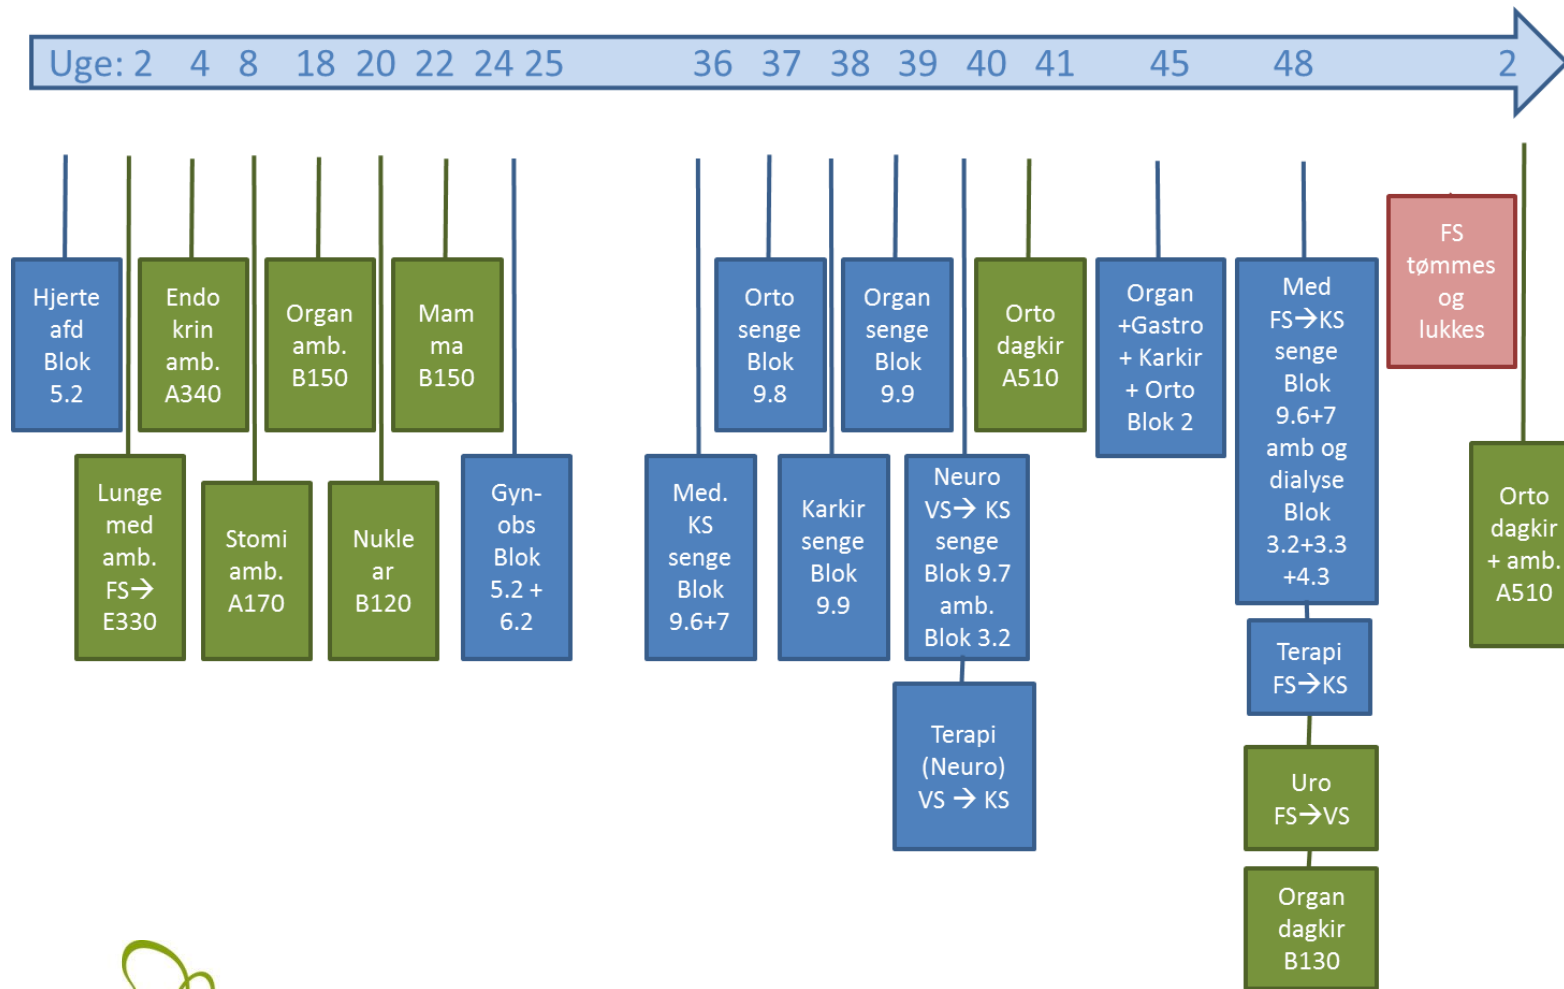

Rokadens år 2016

Byggeriet er snart færdigt

Vi har aftalt, hvor vi skal bo (senge og ambulatorier)

Planlægningsgruppen har opstillet rækkefølgen af flytningerne (afstemt med bindinger til byggeri og lukning af FS)

Nu skal vi til at flytte

... og drive patienternes sygehus samtidig

Kræver forberedelse, planlægning og en ekstra indsats



Styregruppen for rokadeplanlægning

Ledelse og strategiske beslutninger ved rokader på SLB

Sekretariat

Rokadechef: Steen A. Schmidt

Tavlemøder
KS og VS

Rokadegruppe 1: Planlægning og udførelse af rokaden for Afdeling 1
Arbejdet og ansvaret er forankret hos afdelingsledelsen

Rokadegruppe 2: Planlægning og udførelse af rokaden for Afdeling 2
Arbejdet og ansvaret er forankret hos afdelingsledelsen

Rokadegruppe 3: Planlægning og udførelse af rokaden for Afdeling 3
Arbejdet og ansvaret er forankret hos afdelingsledelsen

Rokadegruppe 16: Planlægning og udførelse af rokaden for Afdeling 16
Arbejdet og ansvaret er forankret hos afdelingsledelsen



Afdelingsledelsens opgaver og ansvar

Planlægge og udføre rokaden

Nedsætte afdelingens rokadegruppe

Planlægge processen og inddrage relevante medarbejdere

Sikre gennemførelse før, under og efter rokaden

Koordinere med nye naboafdelinger (drift i de nye rammer)

Løbende tilbagemeldinger til styregruppen



Rokadegruppen

Der er hjælp at hente...

På intranettet er rokaderne beskrevet

Og forskellige redskaber og støttefunktioner
kan hjælpe rokaderne på vej

<http://intranet.sygehuslillebaelt.dk/rokader>

Brug redskaberne

Spørg kontaktpersonerne

Sig til hvis dele af processen ikke går efter planen



Rokadekufferten er pakket



Ansvar og milepæle [Milepæle i rokaden 03.02.2016 - revideret.pdf](#)

FOKUS [Fokus 1.mp4](#)

Fysiske rammer

Optimering

Kompetencer

Udvikle flow og arbejdsgange

Samarbejde

Hvad har været godt?

Fordeling af sengepladserne

Kapacitetskonferencer

Ambulatorier og kontorer fordeling

Fokus

Nedbrydelse af silotænkningen

Sparringsmøder

Standardisering/generelt

Samarbejdet mellem afd og

Projektafdelingen/PLØK




Udfordringer?

For langt et slip – brugergrupperne

Tiden løber fra projektet

Bufferafdeling



15

Pladsforhold – sengebygningen - Myter

Sengebygningen:

- Lavet uden nogen form for depotplads
- Lavet med meget smalle gange
- Lavet med meget små elevatore
- Lavet med for få elevatore
- Lavet mindre end planlagt
- Uden skabe og rengøringsrum



16



Sygehus Lillebælt

Pladsforhold - sengebygningen

I Sengebygningen ***er der:***

- Ca 40 m² depotplads incl 30 faste skabe
- Der er indbyggede skabe på gangene ca. 24 stk
- Elevatorene som måler 2,85 x 4,1 m (altså større end dem vi har i dag)
- Der er 7 elevatorer, en disponibel og en køkkenelevator (den disponible kan anvendes som depot)
- 2 rengøringsrum pr etage
- 2,9 m brede gange med mulighed for passage af 2 senge med udstyr



FACTS

Spørgsmål ?

TAG DEL I PROCESSEN



devote yourself to
an idea.
go make it happen.
struggle on it.
overcome your fears.
smile. dont you forget:
this is your dream.

wordconcept

KOMMUNIKER VISIONEN




Region Syddanmark

Sygehus Lillebælt
