



Metoder og tiltag der forbereder og gearer organisationen til nybyggede rammer



Vagn Bach
Lægefaglig vicedirektør, MPA

REGION SJÆLLAND
NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE




-vi er til for dig

Slagelse Sygehus

- byggerier mod 2020

Ideoplæg Slagelse akutsygehus frem til 2020

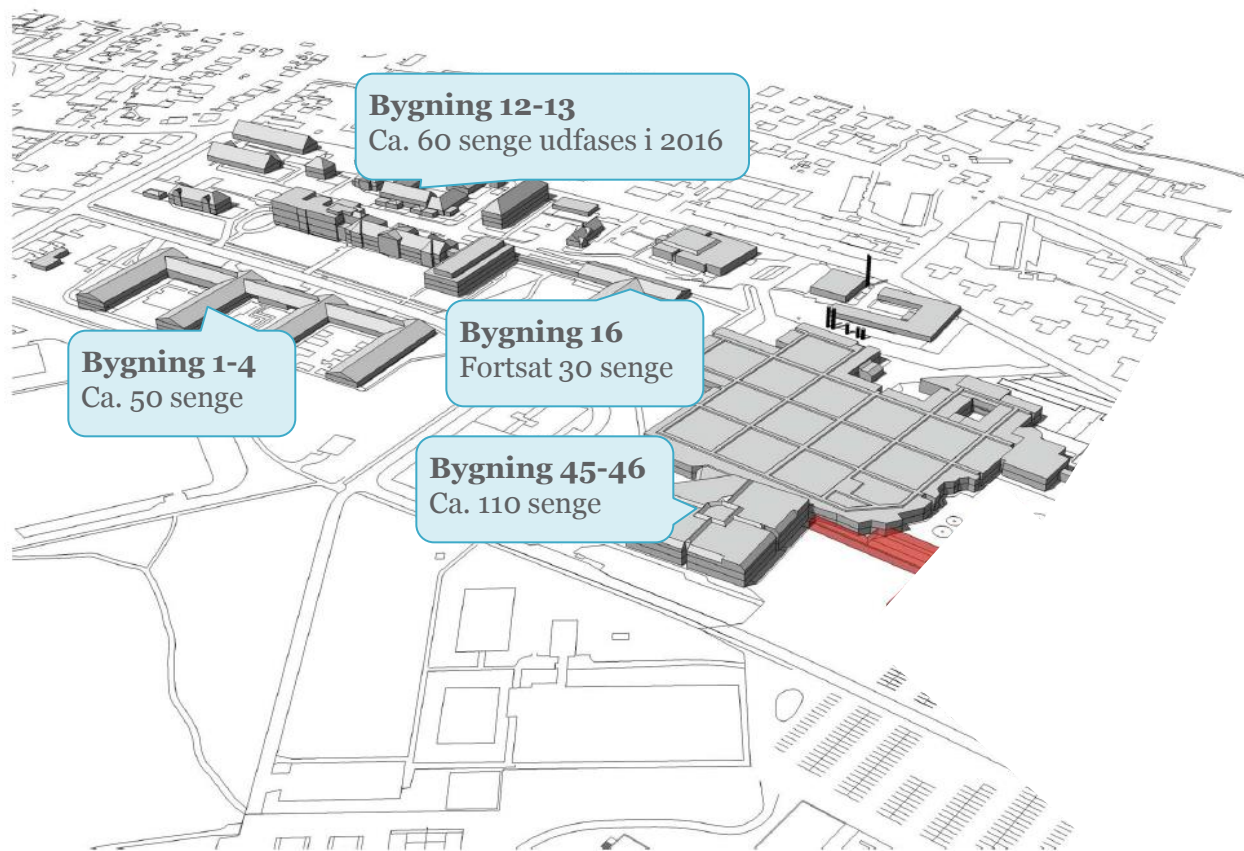

Slagelse sygehus





- **Ideoplægget marts 2009**
- **Kvalitetsfondsansøgningen nov. 2009**
- **Tilsagn juli 2010**
- **Projektforslag nov. 2010**
- **1. spadestik aug. 2011**
- **Rejsegilde okt. 2012**
- **Ibrugtagning nov. 2013**

	Budget 2011, mio.	Dec. 2013, mio.
Entrepriserne	213	248
Medikoudstyr og inv.	40	32
Rådgiverudgifter	26	26
Øvrige omkostninger	7	6
Rådighedsbeløb	24	5
Ialt	310	317

- **Rådgivere er også entreprenører!**
- **Sæt tid til projektgranskninger!**
- **Sæt tid til ibrugtagning!**
- **Hold reserver til bygherreleverancer**
- **Brug brugerne! – men sæt forventningerne rigtigt**
- **Involvér driftsorganisationen løbende**


- **Vigtigt at flytteprocessen er veltilrettelagt**
- **Projektet er ikke færdigt før 1-års-gennemgangen**
- **Vær parat til at håndtere fejl og mangler**
 - Og afsæt penge til det
- **Værdsæt projektet og deltagerne**

- **Funktionalitet**
 - Patientsflow
 - Triage
 - Traumerum og CT scanner
 - Opdelt venteområde til patienter
 - Isolationsstuer
 - Rørpost til lab prøver
- **Personalets sikkerhed:**
 - flugt veje
 - skal-lukning,
 - overfaldsalarmer

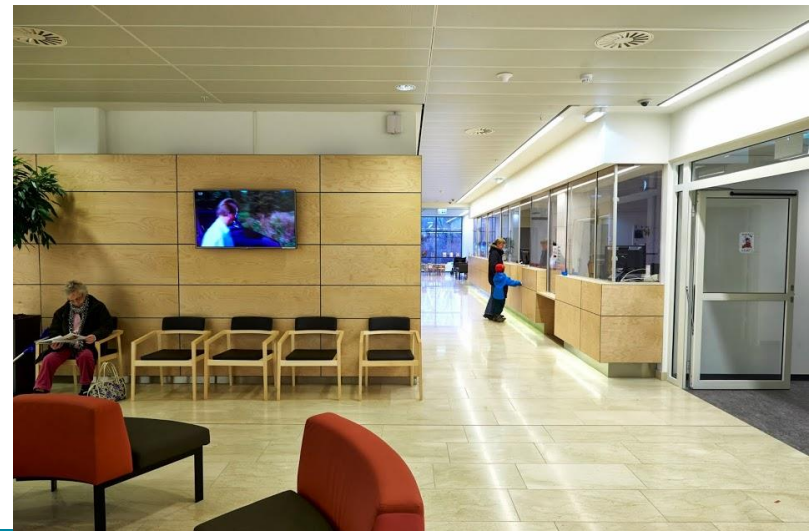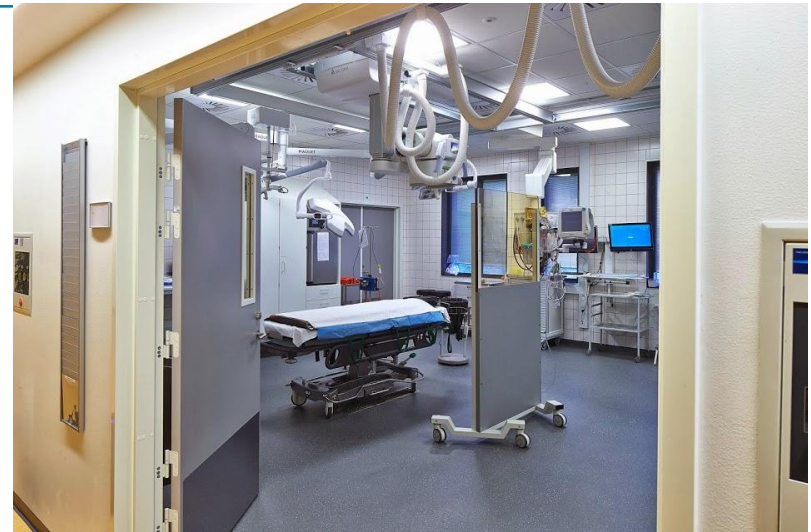

Miljø

- **Enestuer med bad og toilet**
 - Diskretion
 - **Ro i afdelingen**
 - **Patienter oplever det som et hotel.**
 - **Indbydende venteområde**
-
- **Lysforhold**
 - **Ensomhed – ”et fængsel”**
 - **Mulighed for overbelægning**

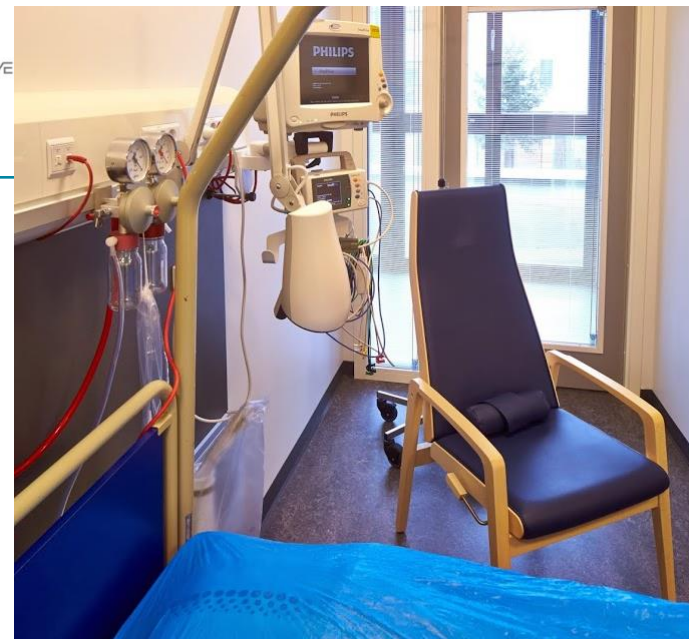

- **Moderne teknologi**
- **Rolige omgivelser**
- **Stuernes indretning**
 - Overvågningsudstyr
 - Ens indretning – skabe, indhold etc
- **Vagtværelser**
- **”pendler” område**

- **Lange afstande**
- **Observations forhold**
- **Lysforhold**
- **Overblik**



Kulturen i den akutte behandling

Ønsker og forventninger

- **Arbejde på stuerne**
- **Samarbejde på tværs**
 - Undgå unødige barrierer
 - ”kamp om patienterne”
 - Minimere overgange
- **Ikke journalskrivning**
 - Prioritere – vurdere – planlægge – behandle
- og så dokumentere
- **Udrydte journalslaven**
 - Bedre supervision
